




1 | INTRODUCTION

1. Présentation au CA	06 mars 2020
2. Publication de l'appel d'offre du marché de travaux	19 mars 2020
3. Ouverture des offres	29 mai 2020
4. Octroi du PU	19 août 2020
5. Présentation au CA	09 septembre 2020
6. Décision octroi PE	14 septembre 2020
7. Début du chantier	Mi-octobre > Fin novembre


Interventions: Enveloppe

Conservation de la façade principale
Isolation par l'intérieur
Remplacement des châssis

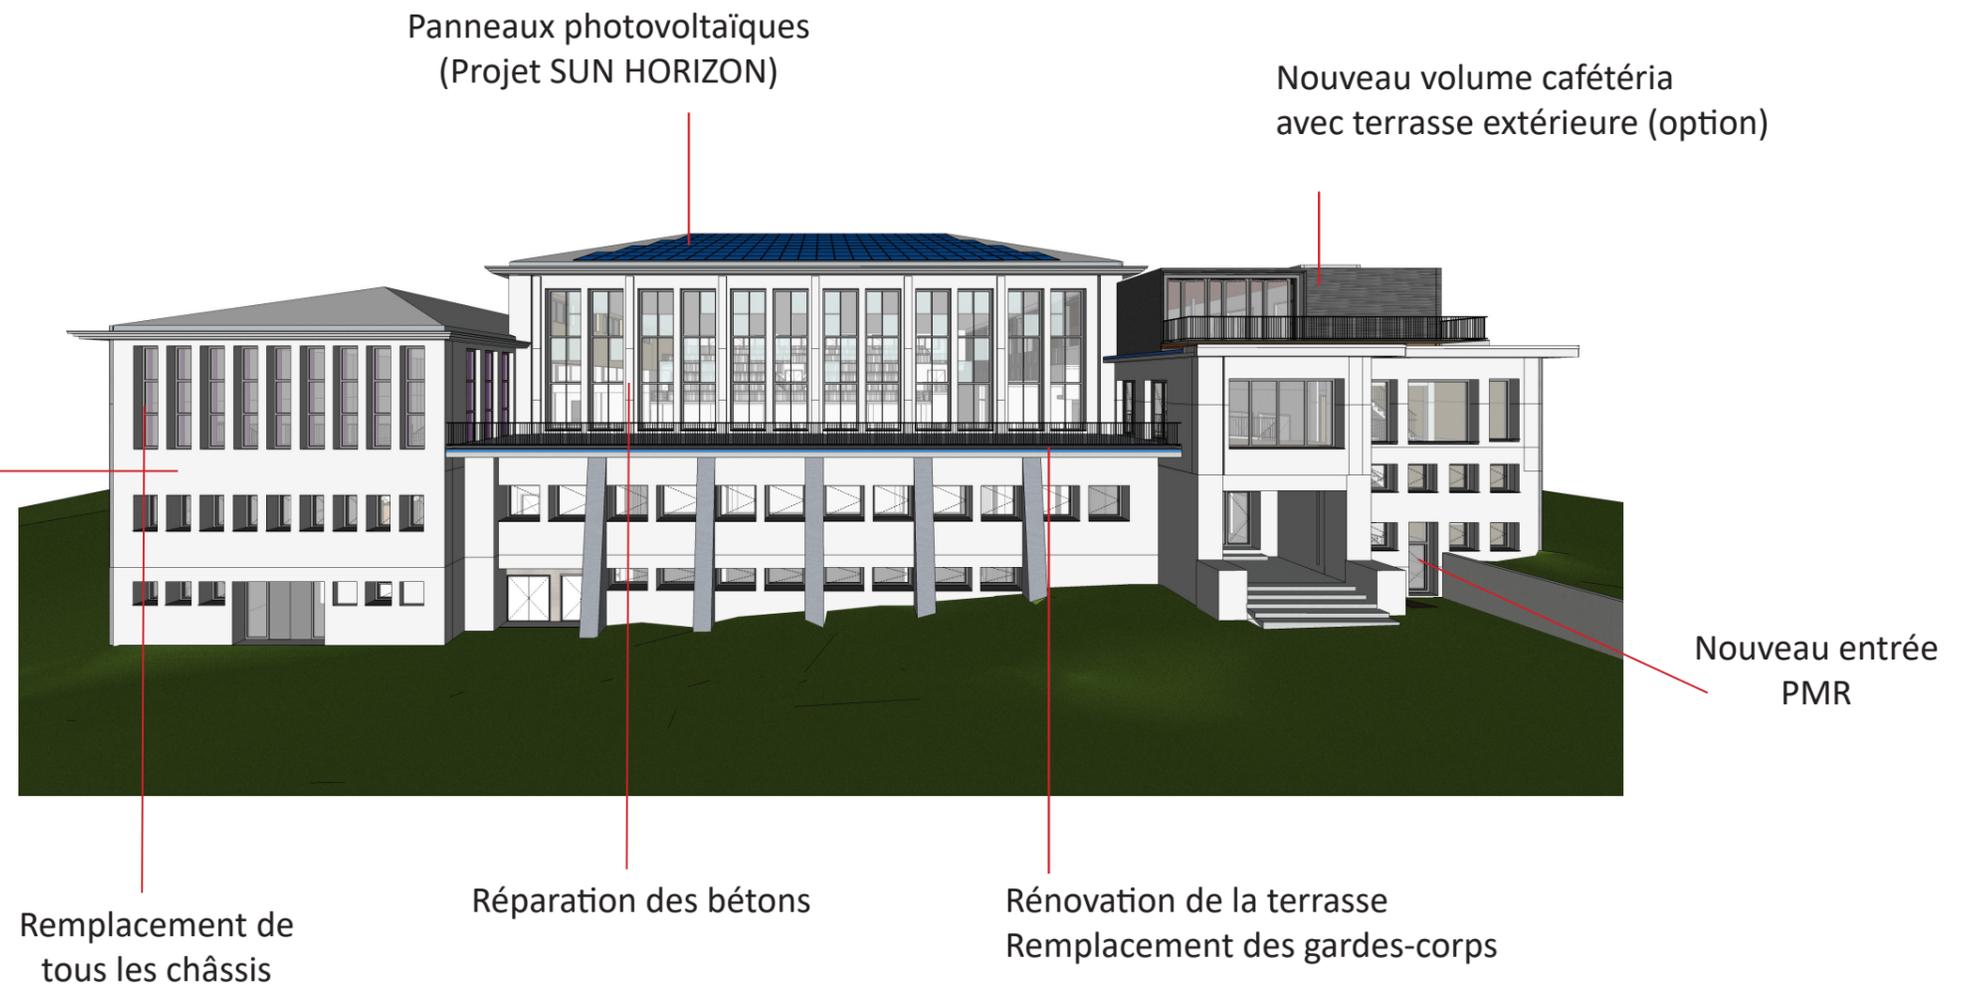

2 | CONCEPT URBANISTIQUE ET ARCHITECTURAL

Interventions: Intérieures

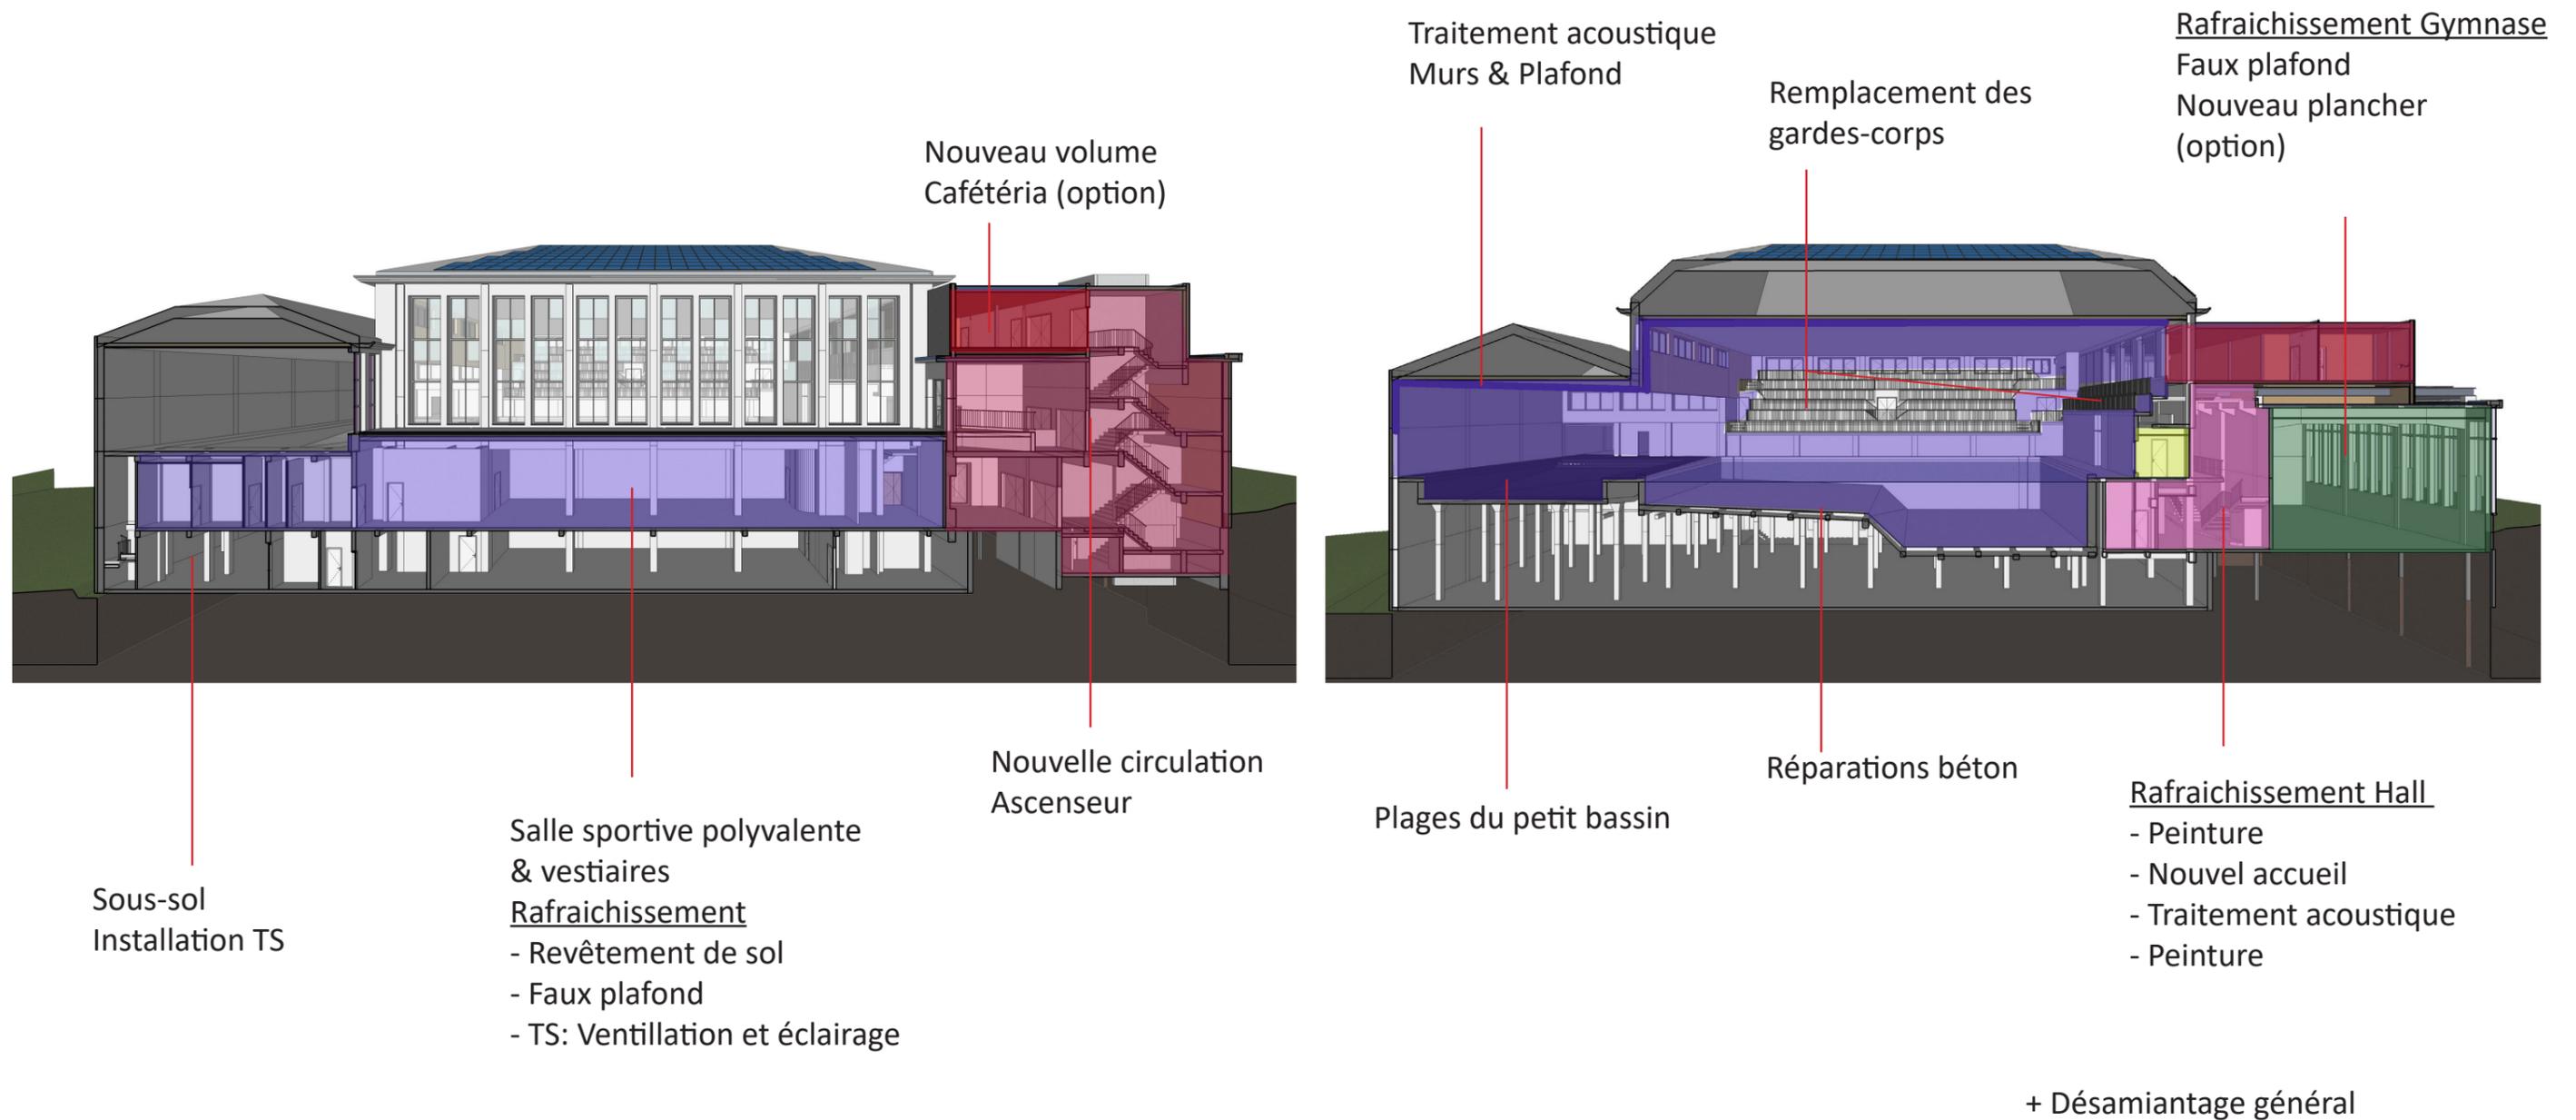

Vue intérieure 1



Vue intérieure 2



2 | CONCEPT URBANISTIQUE ET ARCHITECTURAL

Vue intérieure 3



ASYMETRIE

Vue intérieure 4



LOT 1 - Total offre Valens 1.731.396,41 € options incluses

ENTREPRISE VALENS	Offre hors options	1.326.432,41 €	Options	
			Cafeteria	7.068,43 €
			GYM et divers	900,00 €
			Béton	404.964,00 €

LOT 2 - Total offre Moury 4.204.934,14 €

ENTREPRISE MOURY	Offre hors options	3.340.109,82 €	Options	
			Traitements anti-graffitis	9.242,85 €
			Mobilier - Siège des gradins	47.224,38 €
			Hydrosablage	8.029,43 €
			Traitements lichénicides	29.412,99 €
			Peintures extérieures Béton	7.151,98 €
			Cafeteria	747.067,14 €
			Gym faux plafonds	16.695,55 €

LOT 3 - Total offre Close 1.343.928,64 €

ENTREPRISE CLOSE	Offre hors options	1.309.912,70 €	Options	
			Cafeteria	34.015,94 €

LOT 4 - Total offre Klinkenberg: 681.463,75 €

ENTREPRISE KLINKENBERG	Offre hors options	470.122,97 €	Options	
			Cafeteria	30.940,78 €
			Volet	180.400,00

TOTAL hors options	6.446.577,90 €	TOTAL Options incluses	7.969.691,37 €
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

ESTIMATION Auteur de projet	TOTAL hors options	7.063.744,56 €	TOTAL Options incluses	9.179.176,06 €
------------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

4 | PLANNING PRÉVISIONNEL D'EXECUTION DU MARCHÉ

N° MOIS	Date début	Nbr. de J.O.	Date de fin	
	20-08-20			Remise des rapports d'analyse des offres de l'auteur de projet
	09-09-20			C.A. RCA Synergis (= dépôt complet du dossier à Infraspports) Délibération d'attribution et de non-attribution Courriers d'exécution du Marché (Bon de commande)
	14-09-20			Attribution P.E. (Permis d'Environnement)
	29-09-20			Validation de l'attribution des subsides par le Ministre
				LOT 01 (Etps Valens S.A.)
FERMETURE DE LA PISCINE	15-10-20	3	19-10-20	Installation de chantier
	20-10-20	47	24-12-20	Désamiantage
	03-12-20	27	12-01-21	Démolitions
	07-01-21	68	13-04-21	Réparations des bétons
				LOT 02 (Etps MOURY S.A.) + LOTS 03 et 04
	01-03-21	180	16-11-21	Travaux phase 01
	10-06-21	66	10-09-21	Echafaudages - Travaux pendant vacances scolaires
			16-11-21	Réception provisoire - phase1
OUVERTURE DE LA PISCINE	17-11-21	191	17-08-22	Travaux phase 02
	13-06-22	46	17-08-22	Mise en ordre de réception
			17-08-22	Réception provisoire - phase2

